

Stratégie de test logiciel

Projet : TOMSEN

Version : 1.0

Date : 07/08/2026

Auteur : Florence ESCANYE

Statut : Envoyé

Introduction

Objectif du document

Ce document décrit l'approche globale de tests adoptée pour garantir la qualité du produit TOMSEN. Il définit les objectifs, les scénarios, les méthodes, les ressources, le calendrier et les préconisations relatives aux activités de test.

Public cible

Equipe de développement, équipe QA, Product Owner, parties prenantes métier.

Références

- Spécifications fonctionnelles
- Prototype Figma
- Revue d'exigences

Fonctionnalités à tester

- Connexion et authentification
- Récupération des données des banques
- Consultation des documents et transactions
- Suivi de consommation
- Conseiller virtuel

Une campagne de non-régression sera également réalisée en fin de campagne sur les fonctionnalités critiques.

Objectifs de test

- Valider la conformité par rapport aux spécifications fonctionnelles
- Garantir la non-régression à chaque livraison
- Assurer la sécurité des données sensibles
- Vérifier que différents projets ne provoquent pas d'interférences entre eux
- Construire progressivement un patrimoine de test pérenne

Scénarios prévus

Scénario	Exigence	Objectif	Priorité
Création d'un compte utilisateur	TOM-6	Vérifier qu'un utilisateur peut créer un nouveau compte conformément aux spécifications	Critique
Téléversement des pièces justificatives	TOM-7	Vérifier que l'utilisateur peut transmettre les documents nécessaires à justifier de son identité et de sa location	Critique
Authentification double facteur	TOM-8	Les nouvelles connexions utilisateur demande une authentification double facteur afin de sécurisé l'accès au système	Critique
Authentification par biométrie	TOM-9	L'utilisateur peut s'authentifier par biométrie pour une méthode de connexion plus rapide et sécurisée	Majeure
Tableau de bord	TOM-11	L'utilisateur peut consulter ses informations bancaires	Critique
Consultations des transactions	TOM-13	L'utilisateur peut consulter ses transactions	Critique
Téléchargement des relevés de compte	TOM-12	L'utilisateur peut télécharger ses derniers relevés bancaires pour chaque banque en PDF	Majeure

Scénario	Exigence	Objectif	Priorité
Suivi de consommation	TOM-14	L'utilisateur peut suivre ses dépenses grâce à un graphique	Majeure
Conseiller virtuel	TOM-15	L'utilisateur peut profiter de conseils sur l'épargne et la consommation	Majeure

Les cas de test associés à chaque scénarios sont regroupés dans le cahier de recette, organisés par sprint.

Critères d'entrée et de sortie

Critères d'entrée (conditions qui doivent être réunies avant le début des tests)

- Spécifications fonctionnelles validées
- Revue d'exigence réalisée
- Exigences à tester identifiées et priorisées
- Scénarios et cas de test nécessaires définis
- Environnement de test installé et accessible
- Version de l'application testable disponible
- Jeux de données de test disponibles
- Comptes utilisateurs nécessaires aux tests disponibles
- Anomalies bloquantes empêchant le démarrage des tests corrigés

Critères de sortie (fin des tests)

- Tous les tests prévus et exécutables ont été exécutés
- Fonctionnalités critiques testées
- Taux de réussite de 100% pour les fonctionnalités critiques
- Taux de réussite $\geq 85\%$ pour les fonctionnalités majeures ou mineures
- Aucune anomalie bloquante ou critique ouverte
- Les tests critiques en échec ont fait l'objet d'un remets après correction
- Les anomalies restantes sont connues, documentées et acceptées par les parties prenantes
- Résultats de tests documentés
- Rapport de test terminé et partagé

Méthodes de test adaptées

Type de test	Objectif	Responsable	Outils	Priorité
Tests unitaires	Vérifier chaque composant individuellement	Développeurs (automatisé)	Vitest	Majeure
Tests d'intégration	Vérifier les interaction entre composants	Développeurs ou QA	Cypress	Majeure
Tests fonctionnels basés sur les exigences	Vérifier que les fonctionnalités correspondent aux exigences	QA (manuel ou automatisé)		Critique
Tests API	Vérifier le bon fonctionnement des échanges de données entre l'application et les services via l'API : requêtes, réponses, données retournées et gestion des erreurs	QA (automatisé)	Cypress Postman	Critique
Tests exploratoires	Découvrir les anomalies non-anticipées lors de la conception des tests (prévoir un temps limité)	QA (manuel)		Complémentaire
Tests de non-régression	Vérifier qu'une modification n'introduit pas de régression	QA (automatisé)	Cypress	Critique
Tests de performance	Valider le temps de réponse (temps de réponse de la BDF maximum de 30 secondes et une demande toutes les cinq minutes)	QA		Majeure
Tests de sécurité	Identifier les vulnérabilités car l'application traite des données utilisateurs sensibles	QA		Critique
Tests d'accessibilité	Conformité WCAG, optimisation lecteur d'écran, navigation au clavier, contraste, focus, interface adaptée	QA		Majeure

Les tests unitaires seront effectués en amont par les développeurs.

L'équipe QA se concentrera principalement sur les tests fonctionnels afin de vérifier que l'application répond aux exigences définies. Des tests d'intégration permettront également de vérifier que les différentes fonctionnalités communiquent correctement

entre elles, par exemple lors du parcours de création d'un compte suivi du téléversement des justificatifs.

L'équipe QA réalisera également des tests de sécurité, de performance et d'accessibilité afin de s'assurer que l'application est sécurisée, performante et accessible aux utilisateurs.

Enfin, des tests de non-régression et des tests exploratoires permettront respectivement de vérifier que les modifications apportées n'ont pas introduit de régression et d'identifier d'éventuelles anomalies qui ne seraient pas couvertes par les cas de test prévus.

Niveaux de test

- **Tests unitaires (développeurs)**

Vérifie un composant isolé

- **Tests d'intégration (développeurs / QA)**


Vérifie que les données sont bien transmises d'un composant à l'autre

- **Tests système (QA)**

Vérifie que le système complet répond aux exigences définies dans les spécifications fonctionnelles

- **Tests d'acceptation (PO / métier / utilisateurs représentatifs)**

Vérifie que l'application répond aux besoins et attentes des utilisateurs

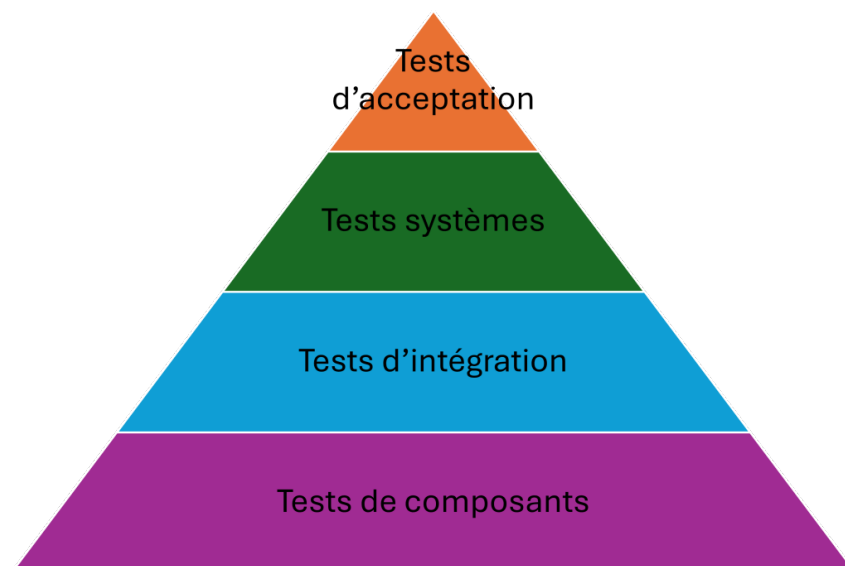

Ressources nécessaires

Ressources humaines

L'équipe QA sera chargée de préparer, exécuter et documenter les tests :

- Analyse des spécifications fonctionnelles et de la revue d'exigence
- Conception et exécution des cas de test
- Identification et documentation des anomalies
- Réalisation des tests de non-régression et exploratoires
- Communication des résultats des tests avec les parties prenantes

Rôle	Nom	Responsabilité
QA Lead	Florence	Pilotage de la stratégie de test
Testeur fonctionnel		Exécution des tests manuels
Testeur		Compétences en API REST
Testeur automatisé		Scripts de tests automatisés avec Cypress

Outils

- Gestion des anomalies avec l'outil de suivi Jira
- Classification des anomalies : Critique / Majeure / Mineure

Données de test

Jeu de données fictives ou anonymisées afin de couvrir les différents parcours utilisateurs :

- Création d'un compte
- Connexion et authentification
- Téléversement de justificatifs
- Accès au tableau de bord
- Différents cas d'erreur et de données invalides

Environnements de test

Environnement	Usage	Données
Environnement QA	Tests fonctionnels, d'intégration, d'accessibilité, exploratoires	Données fictives ou anonymisées
Environnement de pré-production	Tests de performance et sécurité	Copie proche de la production

Étapes clés de la stratégie

Sprints de 2 semaines.

Sprint	Périmètre	Début	Fin
1	Authentification, connexion	18/08/2026	28/08/2026
2	Authentification, connexion	31/08/2026	11/09/2026
3	Récupération des données de banques	14/09/2026	25/09/2026
4	Consultation de documents et transactions	28/09/2026	09/10/2026
5	Suivi de consommation	12/10/2026	23/10/2026
6	Conseiller virtuel	26/10/2026	6/11/2026

Planification d'un sprint :

- Analyse des exigences
- Stratégie de test
- Conception du cahier de recette
- Exécution du cahier de recette (dont suivi des anomalies)
- Bilan et PV de campagne (en fin de campagne)

Les abaques fournies permettent d'estimer la conception et l'exécution des scénarios. Les activités complémentaires, comme les retests, la non-régression et les tests exploratoires, feront l'objet d'une estimation séparée.

Scénario	Complexité	Conception	Exécution	Total (en h)
SC-1	Complexe	2	6	8
SC-2	Moyen	1,5	4,5	6
SC-3	Moyen	1,5	4,5	6
SC-4	Simple	0,5	1,5	2
SC-5	Moyen	1,5	4,5	6
SC-6	Moyen	1,5	4,5	6
SC-7	Moyen	1,5	4,5	6
SC-8	Moyen	1,5	4,5	6
SC-9	Moyen	1,5	4,5	6
SC-10	Moyen	1,5	4,5	6

Activité	Pourquoi ?	Charge proposée (en heures)
Préparation de la campagne	Organisation de la campagne	4
Conception		14,5
Exécution		43,5
Tests exploratoires	Recherche d'anomalies non-couvertes par les cas prévus	8
Retests	Vérification des corrections, rejouer les cas ayant échoués	12
Non-régression		8
Tests d'interaction avec l'autre projet		4
Bilan		4
TOTAL		98

Ces charges pourront être réévaluées en fonction du volume d'anomalies détectées, des corrections nécessaires et des informations complémentaires à venir.

Campagne de non-régression

Une campagne de non-régression sera réalisée à la fin de l'exécution des tests afin de vérifier que les différentes évolutions apportées à TOMSEN n'ont pas introduit de régression sur les fonctionnalités existantes.

La campagne portera sur les fonctionnalités critiques, conformément aux attentes du projet.

Élément	Préconisation
Quand ?	En fin de campagne, avant la mise en production
Périmètre	Fonctionnalités critiques
Objectif	Vérifier l'absence de régression
Tests utilisés	Cas de test critiques déjà validés
Interaction avec l'autre projet	Tests ciblés sur les fonctionnalités susceptibles d'interagir
Retest	Rejouer les tests ayant échoués après correction
Critère de sortie	100% des tests critiques validés

Livrables de test

- Revue d'exigences
- Stratégie de test
- Cahier de recette
- Suivi des anomalies
- Résultats des tests
- Bilan de campagne

Risques et mitigation

Risque	Impact	Probabilité	Mitigation
Retard de livraison du développement	Fort	Moyenne	Priorisation des cas critiques
Environnement de test instable	Moyen	Faible	Environnement dédié
Couverture fonctionnelle incomplète	Fort	Moyenne	Revue croisée avec le PO
Interaction avec un projet développé par une autre équipe	Moyen	Faible	Prévoir des tests d'intégration et une campagne de non-régression ciblée

Préconisations

- **Clarifier les exigences fonctionnelles** qui présentent des ambiguïtés ou des informations manquantes avant la conception définitive des cas de test.
- **Prioriser les tests** sur les fonctionnalités critiques, notamment la création de compte, l'authentification, le téléversement des justificatifs et l'accès au tableau de bord.
- **Clarifier et vérifier les exigences de sécurité** relatives au téléversement et au stockage des justificatifs afin de garantir la protection des données sensibles.
- **Prévoir des contrôles d'accessibilité** afin de vérifier que l'application peut être utilisée par le plus grand nombre d'utilisateurs.
- **Mettre en place des tests de non-régression** après chaque correction ou évolution susceptible d'avoir un impact sur les fonctionnalités existantes.
- **Mettre en place une vérification ciblée** afin de s'assurer que le projet venant ajouter une autre fonctionnalité dans TOMSEN ne provoque pas d'interférence avec les fonctionnalités critiques. Le périmètre précis de ces tests sera défini lorsque les informations concernant cette fonctionnalité seront disponibles.
- **Prévoir des tests exploratoires** en complément des cas de test définis afin de détecter des anomalies non anticipées.
- **Utiliser des données de test fictives ou anonymisées**, particulièrement pour les informations personnelles et les justificatifs.
- **Maintenir un suivi des anomalies** afin de garantir leur traçabilité, leur priorisation et leur résolution avant la mise en production.
